

|    |   |        |          |
|----|---|--------|----------|
| 8  | Тестирование завершено                        | 0 дней | 15.09.22 |
| 9  | Документация                                  | 1 день | 15.09.22 |
| 10 | Разработка программного обеспечения завершена | 0 дней | 15.09.22 |

10. Декомпозируйте план проекта, добавив в него следующие задачи для фазы *Анализ и требования к программному обеспечению*:

- Анализ требований
- Создание спецификации и предварительного бюджета проекта
- Обсуждение спецификаций программного обеспечения и бюджета с группой
- Доработка спецификаций программного обеспечения и бюджета с учетом замечаний
- Разработка графика сдачи
- Закрепление требуемых ресурсов


11. Установите длительность задач фазы *Анализ и требования к программному обеспечению* в соответствии со следующей таблицей:

| Задача   | Длительность |
|--|--------------|
| Анализ требований  | 5 дней       |
| Создание спецификации и предварительного бюджета проекта                     | 3 дня        |
| Обсуждение спецификаций программного обеспечения и бюджета с группой         | 4 часа       |
| Доработка спецификаций программного обеспечения и бюджета с учетом замечаний | 1 день       |
| Разработка графика сдачи   | 1 день       |
| Закрепление требуемых ресурсов   | 1 день       |

12. Установите связи между задачами.

|   | Название   | Продолжительность | Начало        | Окончание     | Предшественники |
|---|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | Анализ и требования к программному продукту              | 12 дней           | 15.09.22 9:00 | 03.10.22 9:00 |                 |
| 2 | Анализ требований  | 5 дней            | 15.09.22 9:00 | 22.09.22 9:00 |                 |
| 3 | Создание спецификации и предварительного бюджета проекта | 3 дня             | 22.09.22 9:00 | 27.09.22 9:00 | 2               |
| 4 | Обсуждение спецификаций ПО и бюджета с группой           | 1 день            | 27.09.22 9:00 | 28.09.22 9:00 | 3               |
| 5 | Доработка спецификаций ПО и бюджета с учетом замечаний   | 1 день            | 28.09.22 9:00 | 29.09.22 9:00 | 4               |
| 6 | Разработка графика сдачи                                 | 1 день            | 29.09.22 9:00 | 30.09.22 9:00 | 5               |
| 7 | Закрепление требуемых ресурсов                           | 1 день            | 30.09.22 9:00 | 03.10.22 9:00 | 6               |
| 8 | Анализ завершён  | 0 дней            | 03.10.22 9:00 | 03.10.22 9:00 | 7               |

13. Созданные задачи и их связи отобразились на Диаграмме Ганта.

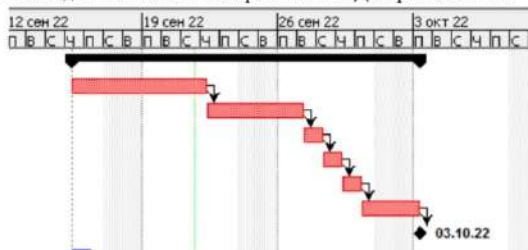

14. Добавьте к задачам исполнителей. Исполнители являются ресурсами проекта. Перейдем к вкладке «Ресурсы», расположенной на боковой панели.



15. В диалоговом окне появится таблица с ресурсами проекта. Добавить в проект 10 исполнителей.

|   | Имя     | РБС | Тип    | E-mail адрес | Единиц. материалов | Инициалы | Группировать         |
|---|---------|-----|--------|--------------|--------------------|----------|----------------------|
| 1 | Иванов  |     | Работа |              |                    | ИИ       | Руководство          |
| 2 | Петров  |     | Работа |              |                    | ПП       | Руководитель проекта |
| 3 | Сидоров |     | Работа |              |                    | СС       | Руководитель проекта |
| 4 | Жуков   |     | Работа |              |                    | ЖЖ       | Работники            |

16. Назначить исполнителей проекта, вписав их имена в соответствующее поле.

|   | Название   | Продолжительность | Начало        | Окончание     | Предшественники | Название |
|---|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| 1 | Анализ и требования к программному продукту              | 12 дней           | 15.09.22 9:00 | 03.10.22 9:00 |                 |          |
| 2 | Анализ требований  | 5 дней            | 15.09.22 9:00 | 22.09.22 9:00 |                 | Иванов   |
| 3 | Создание спецификации и предварительного бюджета проекта | 3 дня             | 22.09.22 9:00 | 27.09.22 9:00 | 2               | Иванов   |
| 4 | Обсуждение спецификаций ПО и бюджета с группой           | 1 день            | 27.09.22 9:00 | 28.09.22 9:00 | 3               | Сидоров  |
| 5 | Доработка спецификаций ПО и бюджета с учетом замечаний   | 1 день            | 28.09.22 9:00 | 29.09.22 9:00 | 4               | Жуков    |
| 6 | Разработка графика сдачи                                 | 1 день            | 29.09.22 9:00 | 30.09.22 9:00 | 5               | Иванов   |
| 7 | Закрепление требуемых ресурсов                           | 1 день            | 30.09.22 9:00 | 03.10.22 9:00 | 6               | Жуков    |
| 8 | Анализ завершён  | 0 дней            | 03.10.22 9:00 | 03.10.22 9:00 | 7               |          |

17. В случае если попытаться ввести имя несуществующего ресурса, программа выве-
