


| | | | | | | |
|---|--|--------|---------------|---------------|---|--------|
| 5 | Доработка спецификаций ПО и бюджета с учетом замечаний | 1 день | 29.09.22 9:00 | 29.09.22 9:00 | 4 | Жуков |
| 6 | Разработка графика сдачи | 1 день | 30.09.22 9:00 | 30.09.22 9:00 | 5 | Иванов |
| 7 | Завершение требуемых ресурсов | 1 день | 30.09.22 9:00 | 03.10.22 9:00 | 6 | Жуков |
| 8 | Анализ завершен | 0 дней | 03.10.22 9:00 | 03.10.22 9:00 | 7 | |

17. В случае если попытаться ввести имя несуществующего ресурса, программа выведет сообщение об ошибке.




18. Назначенные исполнители отображаются на Диаграмме Ганта.




19. В программе присутствует возможность фильтрации задач на Диаграмме Ганта, а также изменение масштаба отображения временной шкалы.



20. Двойной клик мышью по задаче вызывает окно свойств этой задачи. Вкладка общие позволяет получить информацию о названии, продолжительности и проценте выполнения. Откройте любую задачу проекта.

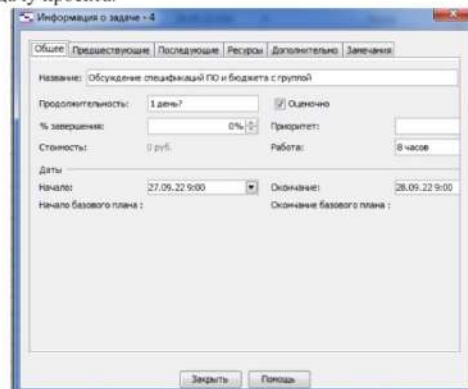

21. Вкладки «Предыдущие» и «Последующие» позволяют получить информацию о связанных задачах. Интерес может представлять вкладка «Ресурсы», на которой будут отображаться исполнители задачи.

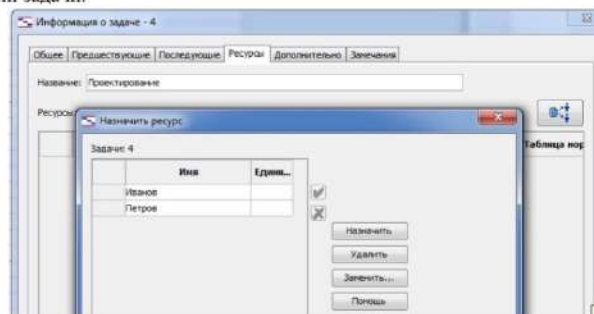

22. Аналогично декомпозируйте план проекта, добавив в него следующие задачи и подфазы:

- фаза Проектирование:
 - Разработка функциональных спецификаций
 - Разработка прототипа на основе функциональной спецификации
 - Ревизия функциональных спецификаций
 - Доработка функциональных спецификаций с учетом замечаний
- фаза Разработка:
 - Определение параметров модульной и уровневой архитектуры
 - Назначение персонала для разработки
 - Разработка кода
- фаза Тестирование:
 - подфаза Тестирование модулей:
 - Тестирование модулей компонента в соответствии со спецификацией продукта
 - Выявление недостатков в спецификациях продукта
 - Изменение кода
