

МДК.02.01 Средства разработки программного обеспечения

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 (4 часа)


Тема: Разработка структуры проекта

Цель занятия: создание структуры проекта и заполнение базовой информации о проекте.


Технология работы:

Задание 1


1. Запустите программу Open Project.
2. Изучите интерфейс программы.
3. Создайте новый проект.




4. В появившемся окне следует заполнить данные о новом проекте. Необходимо указать название проекта, автора, дату начала проекта и краткие сведения.



5. После нажатия на кнопку «Ок» появится пустой проект.

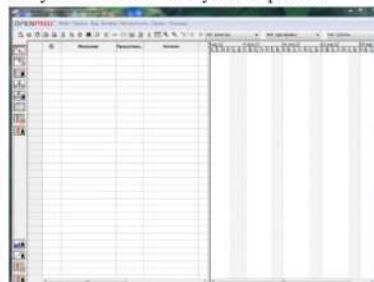

6. После создания проекта необходимо настроить его основные параметры. Для настройки планирования от начальной даты выберите в меню **Проект** пункт **Сведения о проекте**. В появившемся окне ставим *Дату начала*. Да окончания будет рассчитана далее автоматически.

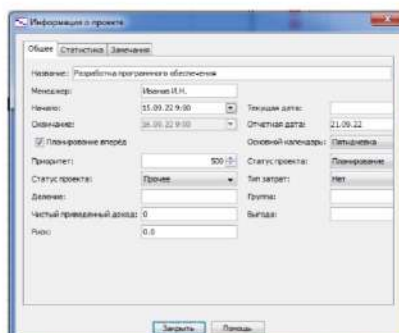

7. Выберите календарь для проекта.

В состав пакета MS Project входит три базовых календаря – стандартный, ночная смена и 24 часа.

В *стандартном календаре* рабочий день начинается с 8:00 и заканчивается в 17:00 с обеденным перерывом с 12:00 до 13:00. Рабочая неделя начинается с понедельника и заканчивается
